
Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
1	**Gebäude 1/5, Landgericht/Verbindungsgbau - Fenstersanierung**	**334 Tage**	
2	**LP 7**	**35 Tage**	
3	Prüfung / Beauftragung	35 Tage	
4	**LP 8**	**289 Tage**	
5	Werk-/Montageplanung (fortlaufend)	23 Tage	3EA+10 Tage
6	Abstimmung / Freigabe (fortlaufend)	10 Tage	5EA-5 Tage
7	Lieferzeit / Fertigungsbeginn (fortlaufend)	32 Tage	6
8	Austausch Saalbeleuchtung	28 Tage	
9	**Ansicht 1 bis 21**	**234 Tage**	
10	Baustelleneinrichtung BA 1, Materialtransport	5 Tage	7EE
11	**BA 1 (detaillierter Ablauf)**	**10 Tage**	
12	**01_xxx + 01_162**	**3 Tage**	
13	Demontage Fenster + Fensterbänke	2 Std.	7
14	Montage Rahmen + Flügel, Dämmung, Abdichtung	8 Std.	13
15	Montage Fensterbänke außen	2 Std.	14
16	Entsorgung, Reinigung Fensterbänke außen	2 Std.	13
17	Reparaturen, Montage Fensterbank innen, Verleistung, Montage Blendschutz	4 Std.	14
18	Austausch Beleuchtung	1 Std.	17EE
19	Reinigung, Qualitäskontrolle, Übergabe	2 Std.	18
20	Puffer	1,5 Tage	15
21	**02_xxx + 02_262**	**2,5 Tage**	
22	Demontage Fenster + Fensterbänke	2 Std.	20
23	Montage Rahmen + Flügel, Dämmung, Abdichtung	8 Std.	22
24	Montage Fensterbänke außen	2 Std.	23
25	Entsorgung, Reinigung Fensterbänke außen	2 Std.	22
26	Reparaturen, Montage Fensterbank innen, Verleistung, Montage Blendschutz	4 Std.	23
27	Austausch Beleuchtung	1 Std.	26EE
28	Reinigung, Qualitäskontrolle, Übergabe	2 Std.	27
29	Puffer	1 Tag	24
30	**03_xxx + 03_362**	**4,5 Tage**	
31	Demontage Fenster + Fensterbänke	2 Std.	29
32	Montage Rahmen + Flügel, Dämmung, Abdichtung	8 Std.	31
33	Montage Fensterbänke außen	2 Std.	32
34	Entsorgung, Reinigung Fensterbänke außen	2 Std.	31
35	Reparaturen, Montage Fensterbank innen, Verleistung, Montage Blendschutz	4 Std.	32

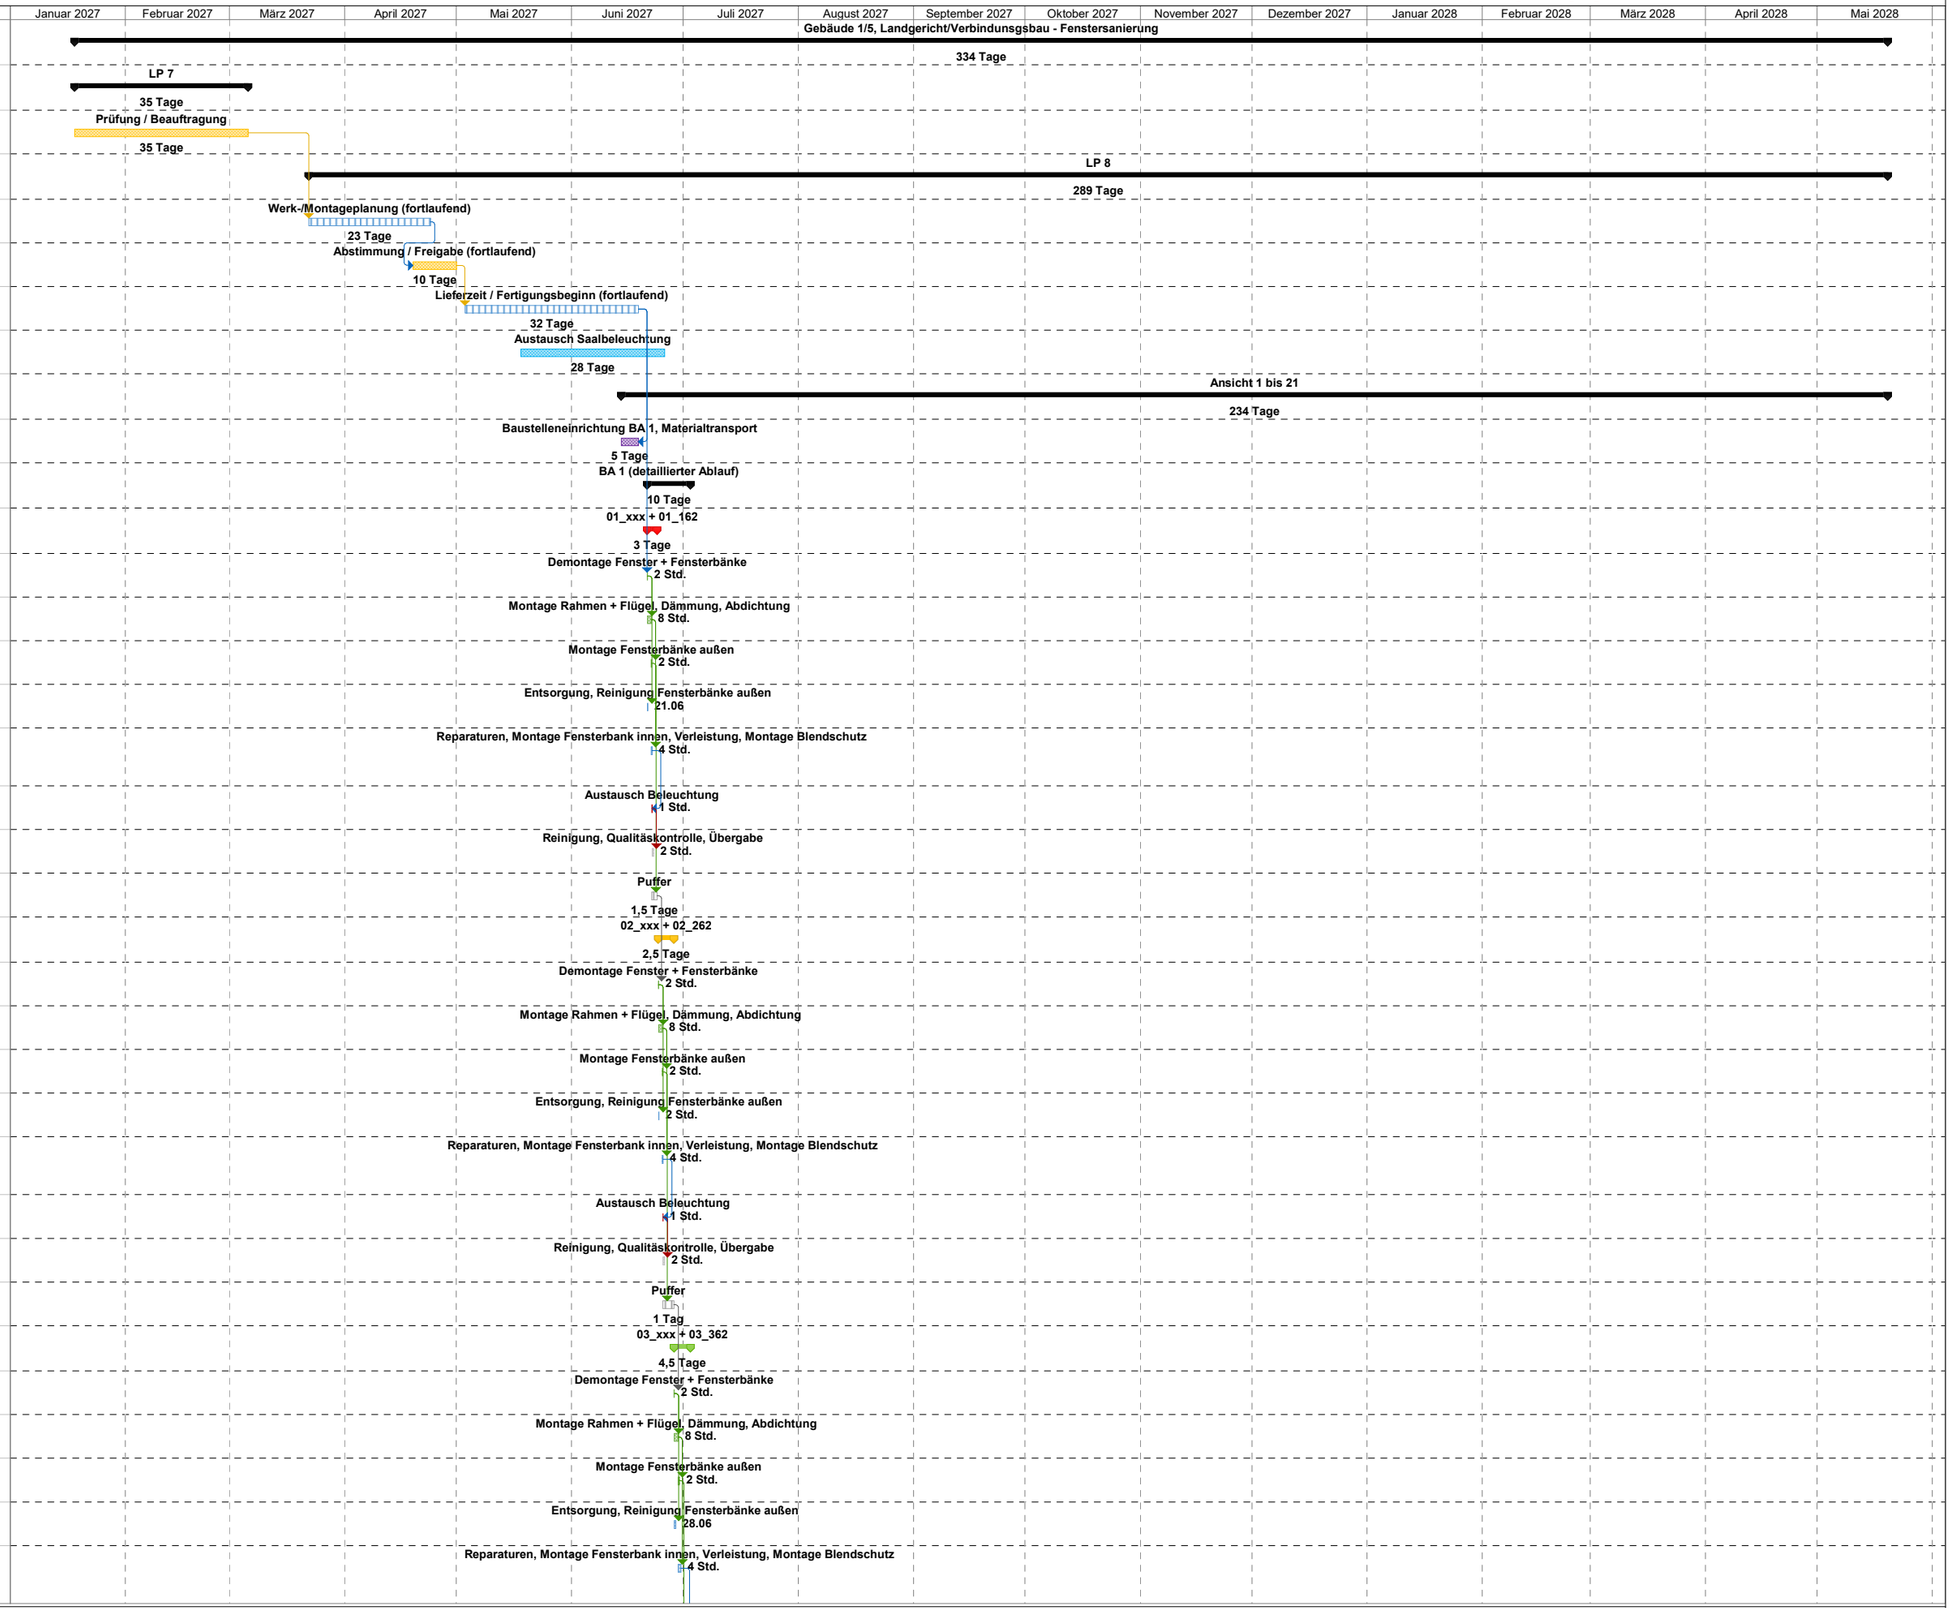

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
36	Austausch Beleuchtung	1 Std.	35EE
37	Reinigung, Qualitäskontrolle, Übergabe	2 Std.	36
38	Puffer	3 Tage	33
39	**BA 2**	**5 Tage**	
40	01_163	2 Tage	38
41	02_263	2 Tage	40EA-0,5 Tage
42	03_363	2 Tage	41EA-0,5 Tage
43	**BA 3**	**5 Tage**	
44	01_164	2 Tage	42
45	02_264	2 Tage	44EA-0,5 Tage
46	03_364	2 Tage	45EA-0,5 Tage
47	**BA 4**	**5,5 Tage**	
48	01_165	2 Tage	46
49	02_265	2 Tage	48EA-0,5 Tage
50	03_365	1,5 Tage	49EA-0,5 Tage
51	03_366	1,5 Tage	50EA-0,5 Tage
52	**BA 5**	**5,5 Tage**	
53	01_166	2 Tage	51
54	02_266	2 Tage	53EA-0,5 Tage
55	03_367	1,5 Tage	54EA-0,5 Tage
56	03_368	1,5 Tage	55EA-0,5 Tage
57	**BA 6**	**9 Tage**	
58	01_167	2 Tage	56
59	01_168	2 Tage	58EA-0,5 Tage
60	02_267	2 Tage	59EA-0,5 Tage
61	02_268	2 Tage	60EA-0,5 Tage
62	03_369	1,5 Tage	61EA+0,5 Tage
63	03_370	1 Tag	62EA-0,5 Tage
64	**BA 7**	**20 Tage**	
65	01_169	1 Tag	63
66	01_170	2 Tage	65EA-0,5 Tage
67	02_269	1 Tag	66EA-0,5 Tage
68	02_270	2 Tage	67EA-0,5 Tage
69	03_371	2 Tage	68EA-0,5 Tage
70	03_372	2 Tage	69EA-0,5 Tage
71	04_456	2 Tage	70EA-0,5 Tage

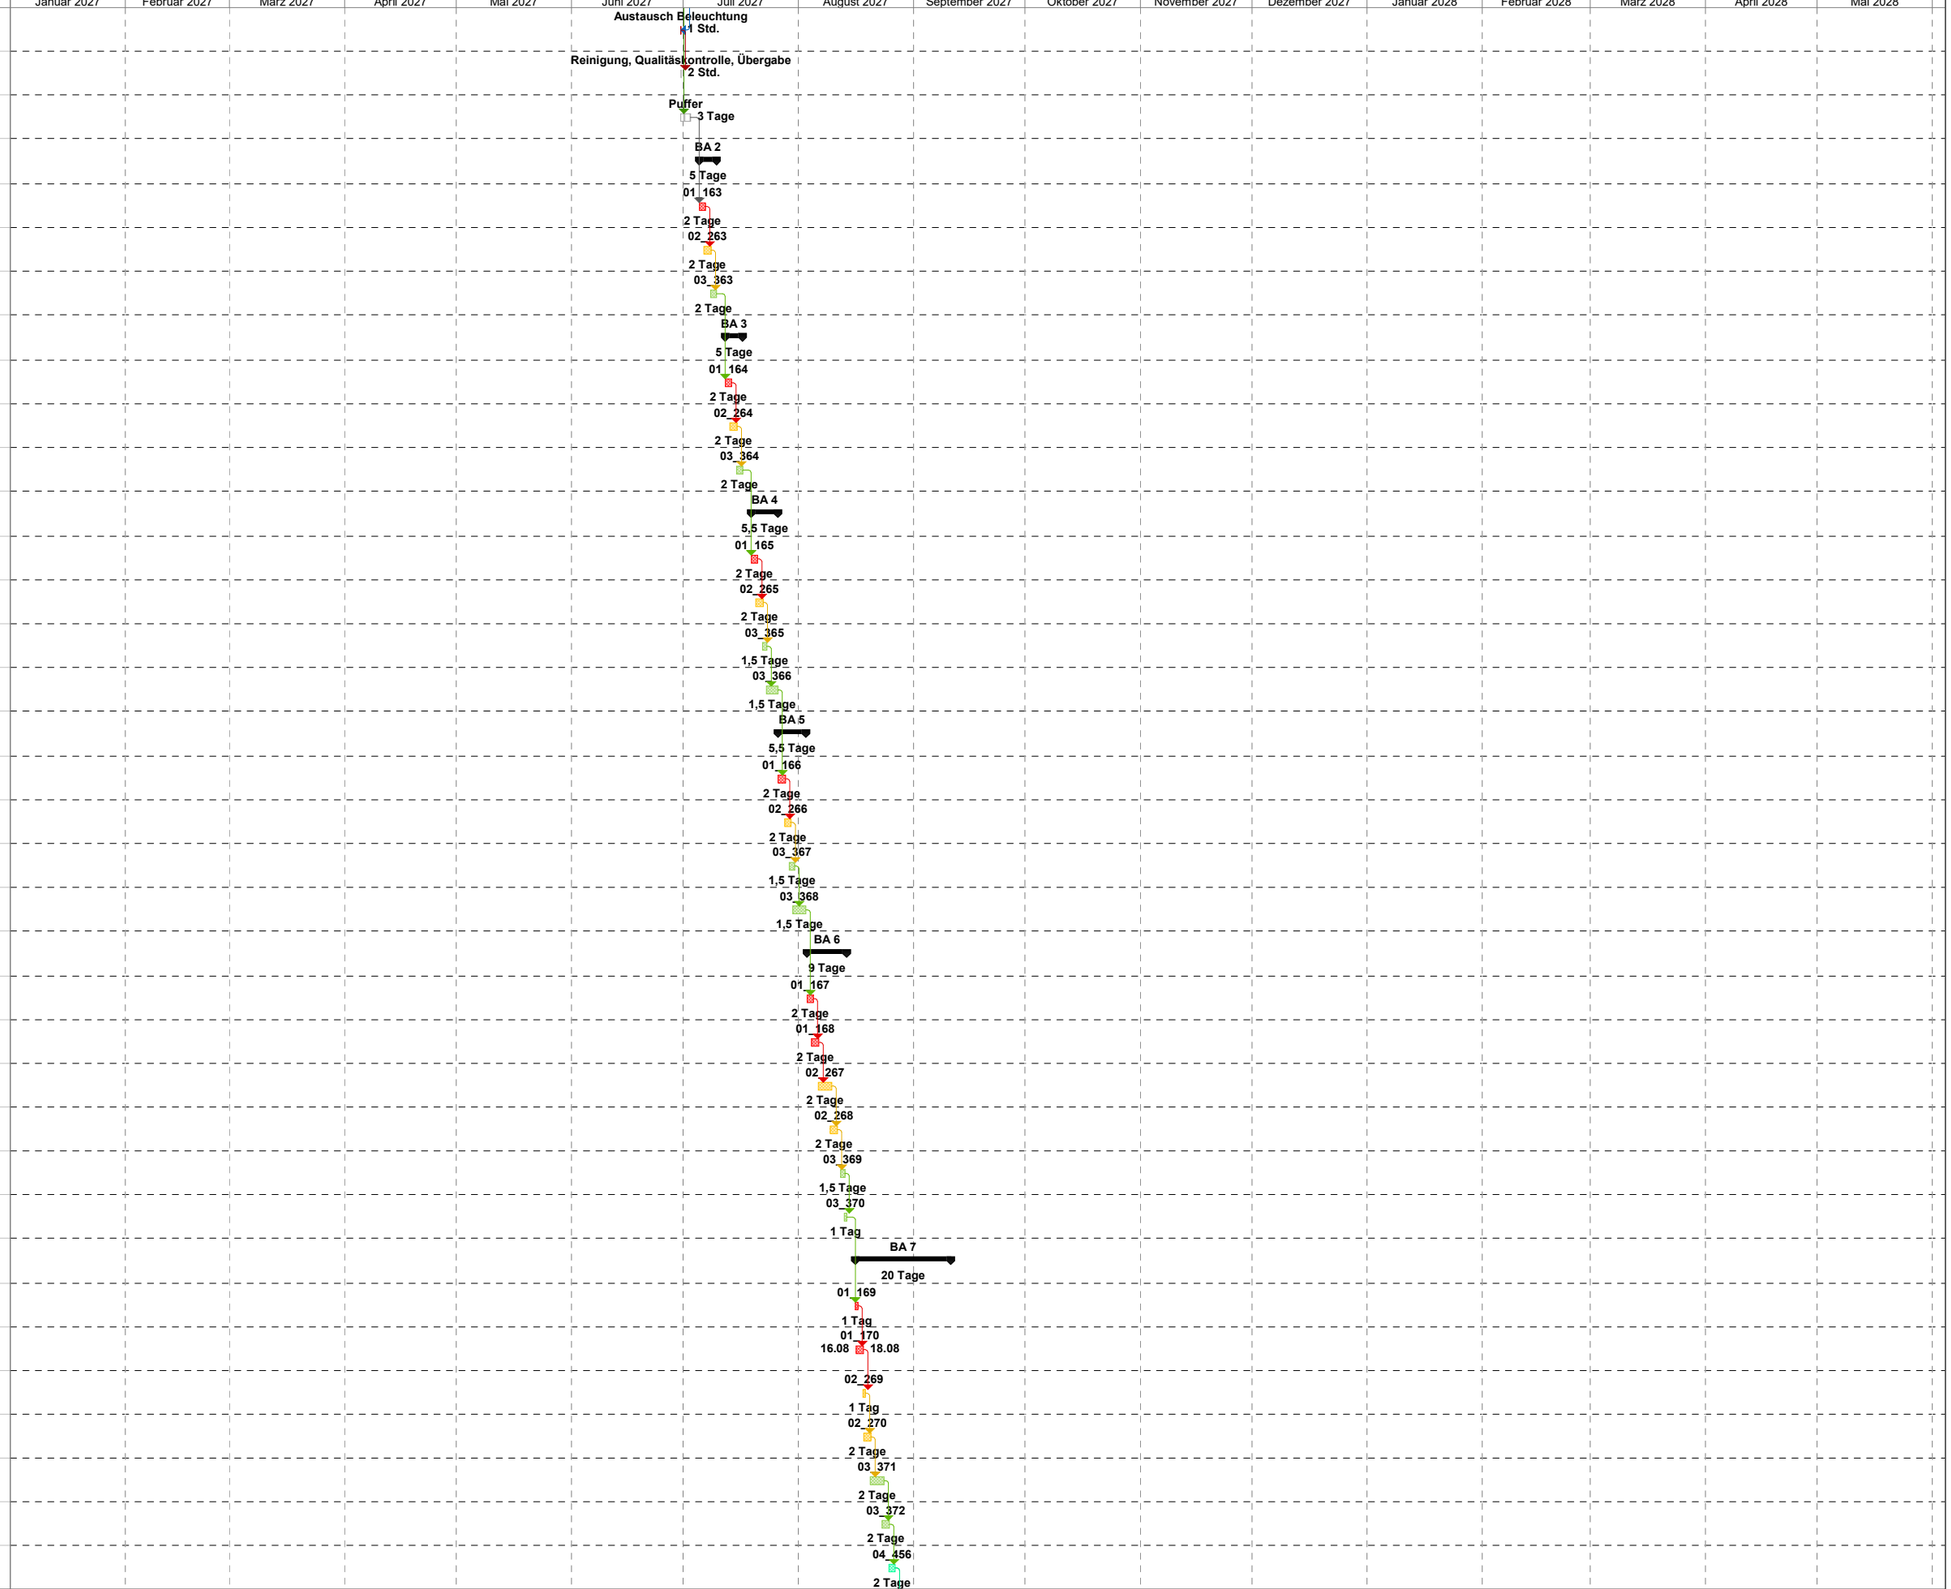

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
72	04_457	1 Tag	71EA-0,5 Tage
73	04_457	1 Tag	71EA-0,5 Tage
74	04_458	2 Tage	73EA-0,5 Tage
75	04_4xx	1 Tag	74EA-0,5 Tage
76	04_455	2 Tage	75EA-0,5 Tage
77	05_555	5 Tage	76EA-0,5 Tage
78	06_652	2 Tage	77EA-1 Tag
79	07_752	2 Tage	78EA-0,5 Tage
80	**BA 8**	**11 Tage**	
81	01_127	2 Tage	79
82	02_222	2 Tage	81EA-0,5 Tage
83	03_323	2 Tage	82EA-0,5 Tage
84	04_421_A1	2 Tage	83EA-0,5 Tage
85	05_518	2 Tage	84EA-0,5 Tage
86	06_617_A1	2 Tage	85EA-0,5 Tage
87	07_706+Flur	2 Tage	86EA-0,5 Tage
88	**BA 9**	**6 Tage**	
89	06_617_A2	1,5 Tage	87
90	05_519	1,5 Tage	89EA-0,5 Tage
91	04_421_A2	1 Tag	90EA-0,5 Tage
92	03_324	1,5 Tage	91EA-0,5 Tage
93	02_223	1,5 Tage	92EA-0,5 Tage
94	01_128	1,5 Tage	93EA-0,5 Tage
95	**BA 10**	**22 Tage**	
96	01_129	1,5 Tage	94
97	02_224	1,5 Tage	96EA+0,5 Tage
98	03_325/326_A1	2,5 Tage	97EA-0,5 Tage
99	04_421_A3	2,5 Tage	98EA-0,5 Tage
100	05_520	1,5 Tage	99EA-0,5 Tage
101	05_521	1,5 Tage	100EA-0,5 Tage
102	06_618	1,5 Tage	101EA-0,5 Tage
103	06_619	1,5 Tage	102EA-0,5 Tage
104	07_Küche (inkl. Vor-/Nacharbeiten) - Herbstferien NRW 2027	11 Tage	103EA-0,5 Tage
105	**BA 11**	**12 Tage**	
106	01_130	3 Tage	104
107	02_225	3 Tage	106EA-0,5 Tage

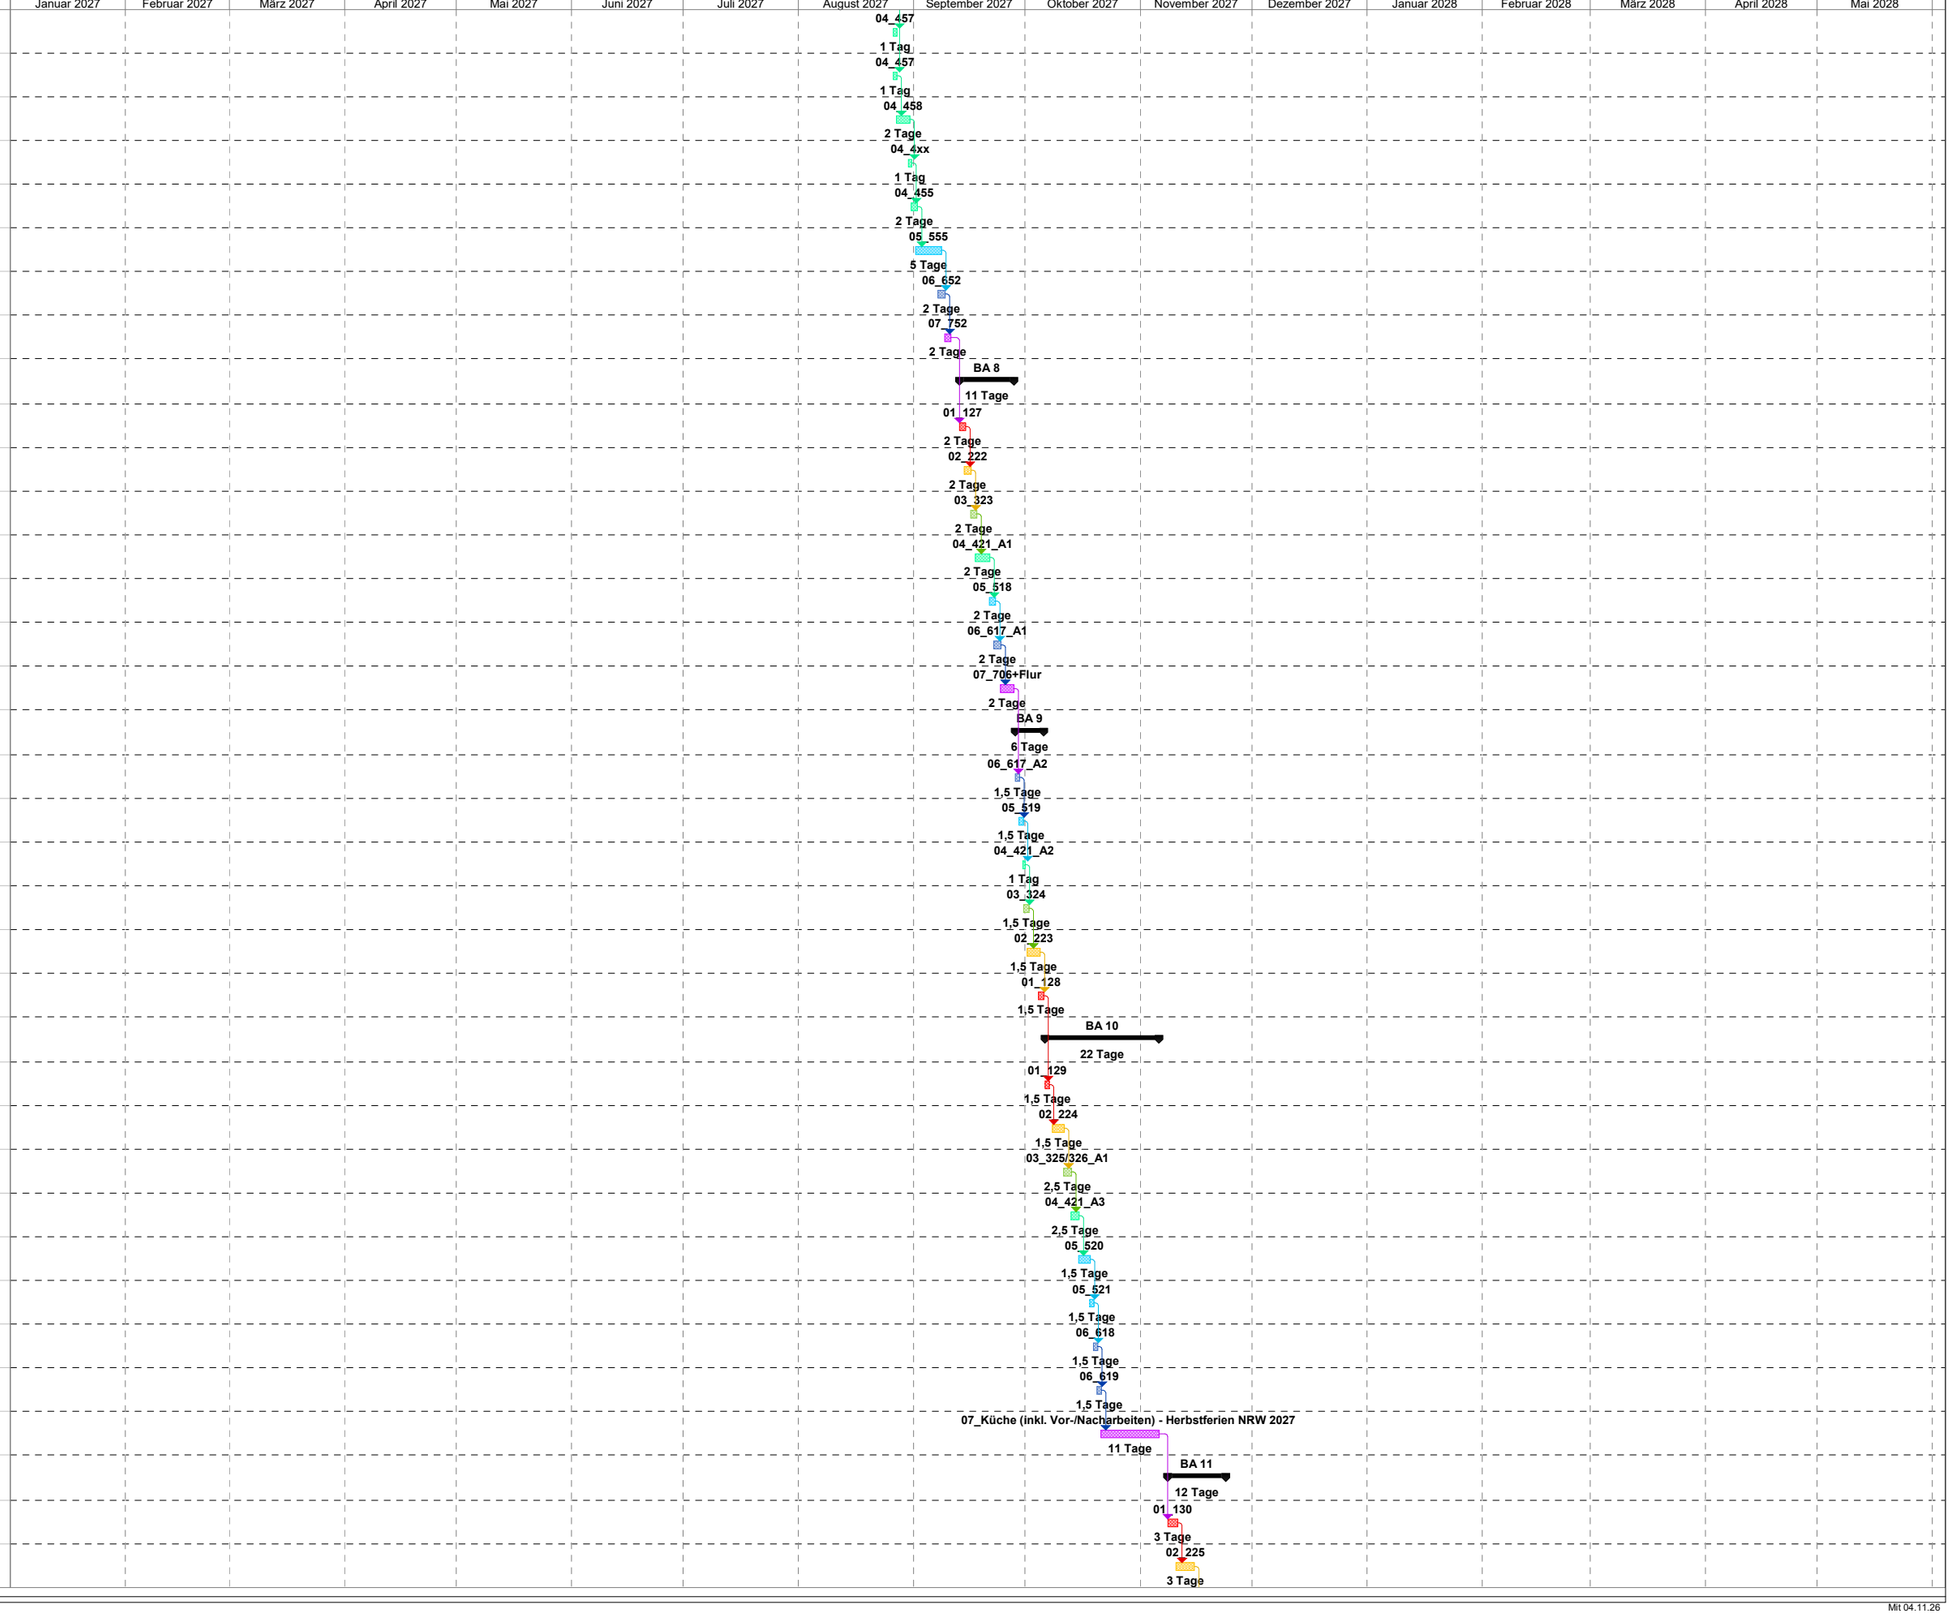

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
108	03_325/326_A2	2,5 Tage	107EA-0,5 Tage
109	04_421_A4	2 Tage	108EA-0,5 Tage
110	05_522	2 Tage	109EA-0,5 Tage
111	06_620	2 Tage	110EA-0,5 Tage
112	**BA 12**	**9,5 Tage**	
113	02_226	1,5 Tage	111
114	03_327	2,5 Tage	113EA-0,5 Tage
115	04_422	1,5 Tage	114EA-0,5 Tage
116	04_423	1,5 Tage	115EA-0,5 Tage
117	05_523	1,5 Tage	116EA-0,5 Tage
118	05_524	1,5 Tage	117EA-0,5 Tage
119	06_621	1,5 Tage	118EA-0,5 Tage
120	06_622	1,5 Tage	119EA-0,5 Tage
121	Puffer	9 Tage	120EA-0,5 Tage
122	**BA 13**	**10 Tage**	
123	02_227	1,5 Tage	121
124	02_228	1,5 Tage	123EA-0,5 Tage
125	03_329	1,5 Tage	124EA-0,5 Tage
126	04_424	1,5 Tage	125EA-0,5 Tage
127	04_425	1,5 Tage	126EA-0,5 Tage
128	05_525	1,5 Tage	127EA-0,5 Tage
129	05_526	1,5 Tage	128EA-0,5 Tage
130	06_623	1,5 Tage	129EA-0,5 Tage
131	06_624	2 Tage	130EA-0,5 Tage
132	**BA 14**	**10 Tage**	
133	01_131	1,5 Tage	131
134	02_229	1,5 Tage	133EA-0,5 Tage
135	02_230	1,5 Tage	134EA-0,5 Tage
136	03_330	1,5 Tage	135EA-0,5 Tage
137	03_331	1,5 Tage	135EA-0,5 Tage
138	04_426	1,5 Tage	137EA-0,5 Tage
139	04_427	1,5 Tage	138EA-0,5 Tage
140	05_527	1,5 Tage	139EA-0,5 Tage
141	05_528	1,5 Tage	140EA-0,5 Tage
142	05_5xx	1 Tag	140EA-0,5 Tage
143	06_625	1,5 Tage	142EA-0,5 Tage

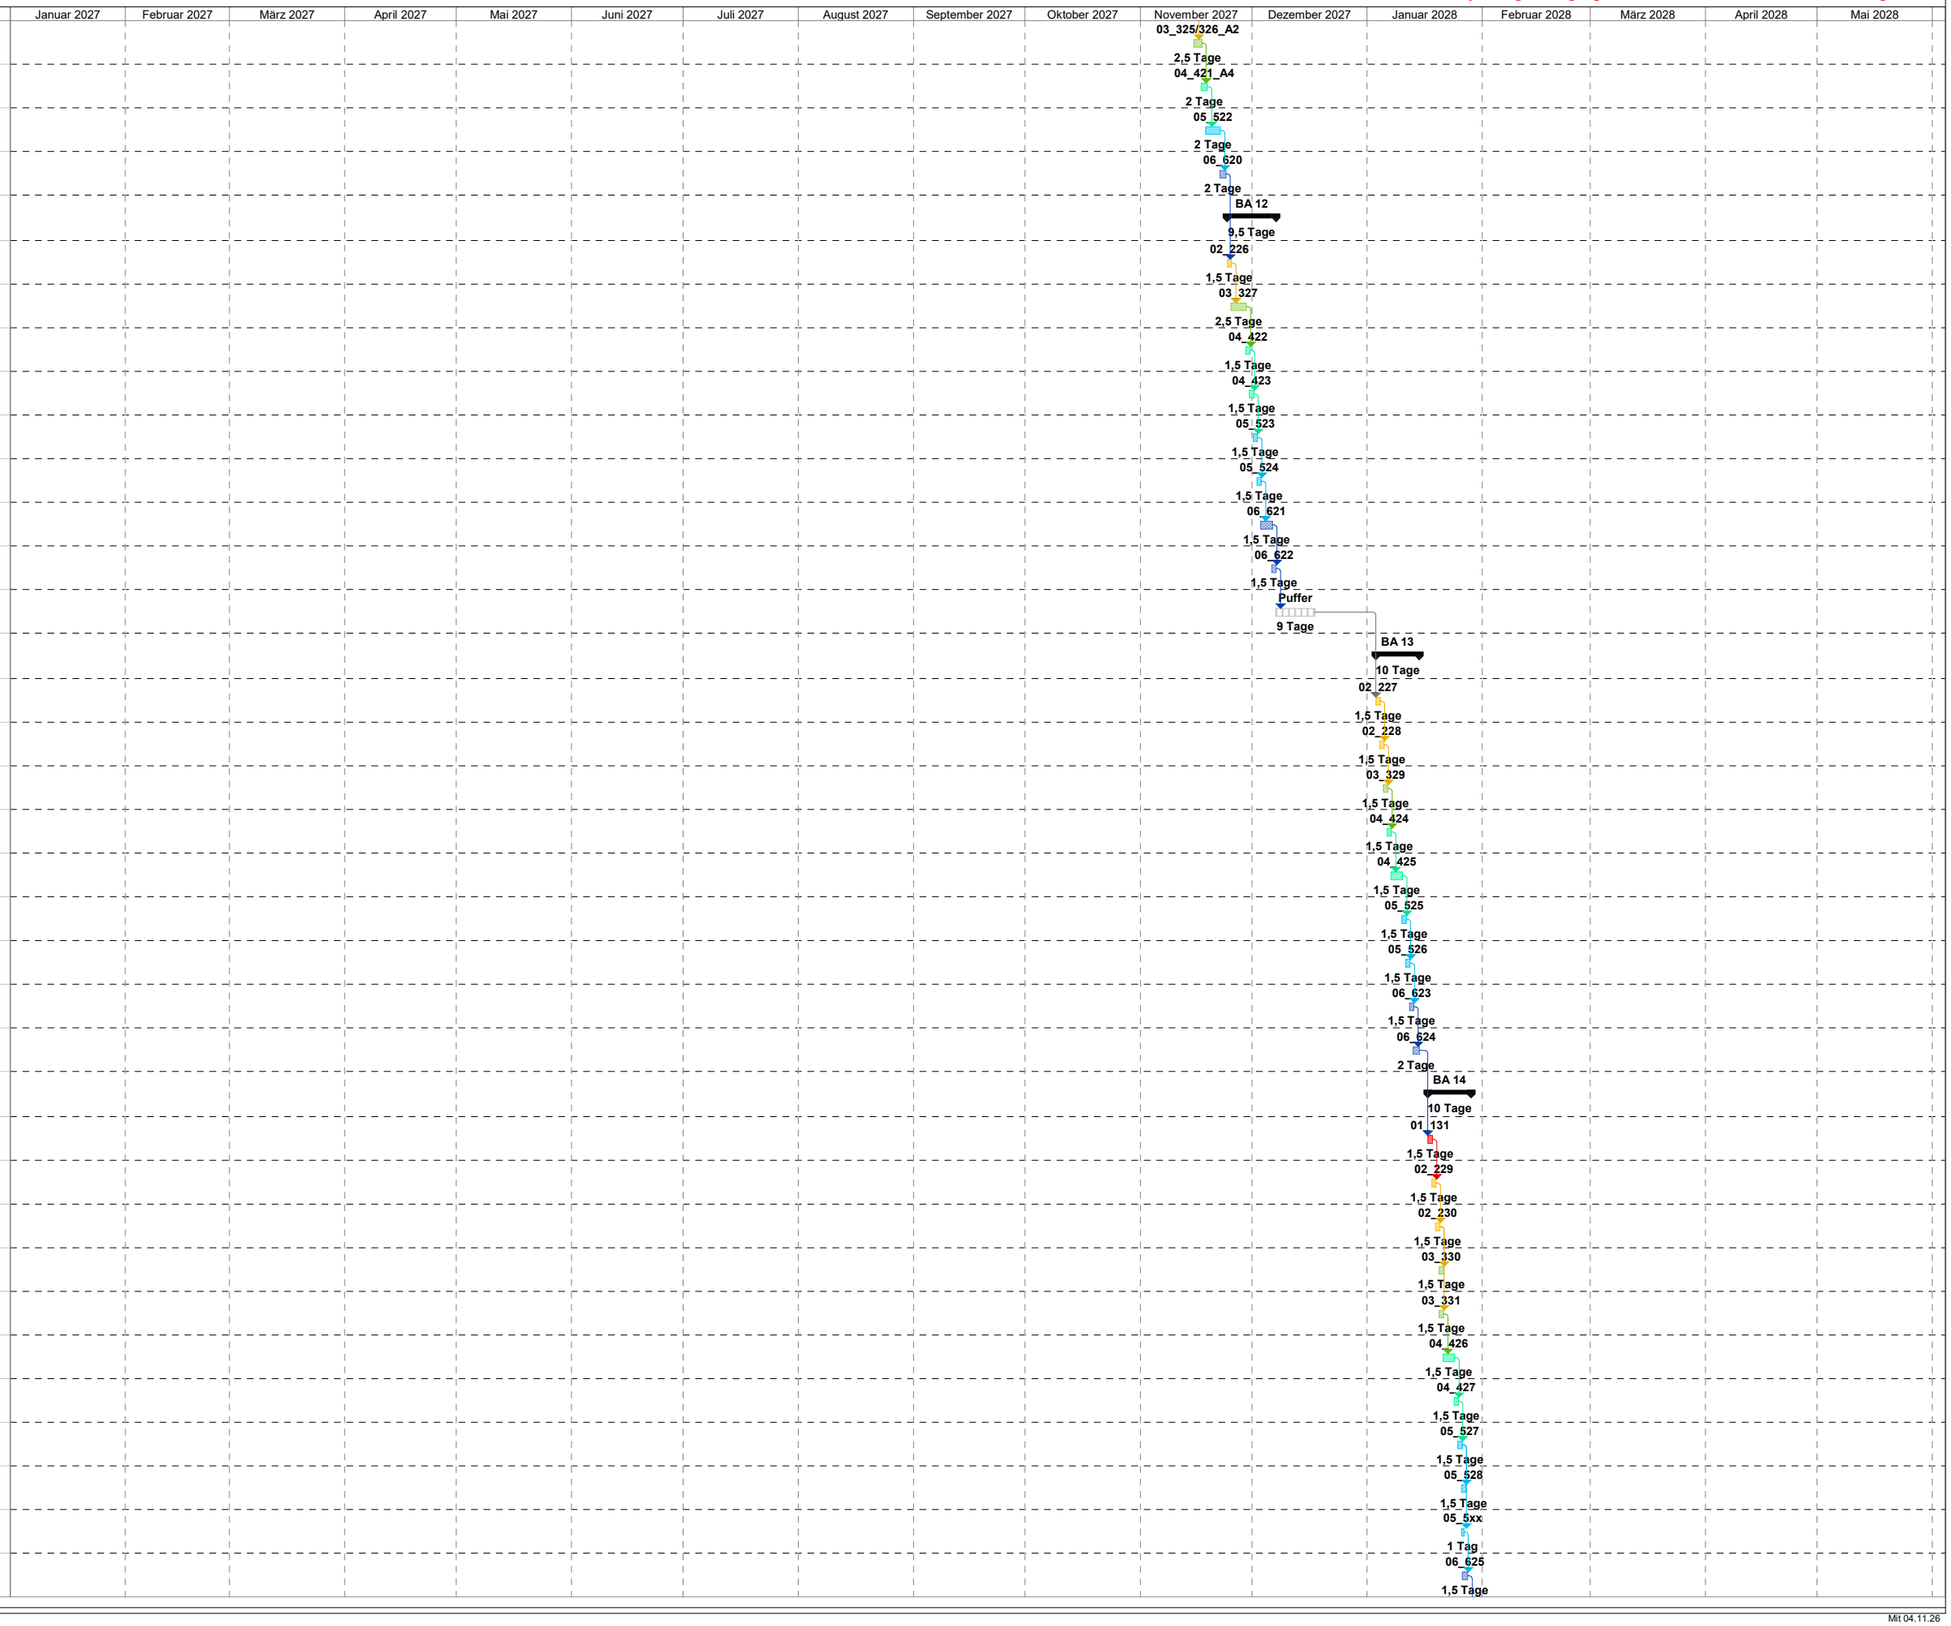


Mit 04.11.26

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
144	06_626	1 Tag	143EA-0,5 Tage
145	06_6xx	1 Tag	144EA-0,5 Tage
146	**BA 15**	**7 Tage**	
147	01_132	2 Tage	145
148	02_231	2,5 Tage	147EA-0,5 Tage
149	03_332	2 Tage	148EA-0,5 Tage
150	04_428	2 Tage	149EA-0,5 Tage
151	**BA 16**	**5 Tage**	
152	01_133	1,5 Tage	150
153	02_232	2 Tage	152EA-0,5 Tage
154	03_333	1,5 Tage	153EA-0,5 Tage
155	04_429	1,5 Tage	154EA-0,5 Tage
156	**BA 17**	**9,5 Tage**	
157	01_134	2 Tage	155
158	02_233	1,5 Tage	157EA-0,5 Tage
159	02_234	1,5 Tage	158EA-0,5 Tage
160	03_334	2 Tage	159EA-0,5 Tage
161	03_336	2 Tage	160EA-0,5 Tage
162	04_430	2,5 Tage	161EA-0,5 Tage
163	04_4xx	1 Tag	162EA-0,5 Tage
164	**BA 18**	**4,5 Tage**	
165	01_135	2,5 Tage	163
166	02_235	1,5 Tage	165EA-0,5 Tage
167	03_337	1,5 Tage	166EA-0,5 Tage
168	**BA 19**	**4 Tage**	
169	01_136	2 Tage	167
170	02_236	1,5 Tage	169EA-0,5 Tage
171	03_338	1,5 Tage	170EA-0,5 Tage
172	**BA 20**	**5 Tage**	
173	01_137	2 Tage	171
174	02_237	2 Tage	173EA-0,5 Tage
175	03_339	2 Tage	174EA-0,5 Tage
176	**BA 21**	**3,5 Tage**	
177	01_1xx	1 Tag	175
178	01_101	1 Tag	177EA-0,5 Tage
179	02_2xx	1 Tag	178EA-0,5 Tage

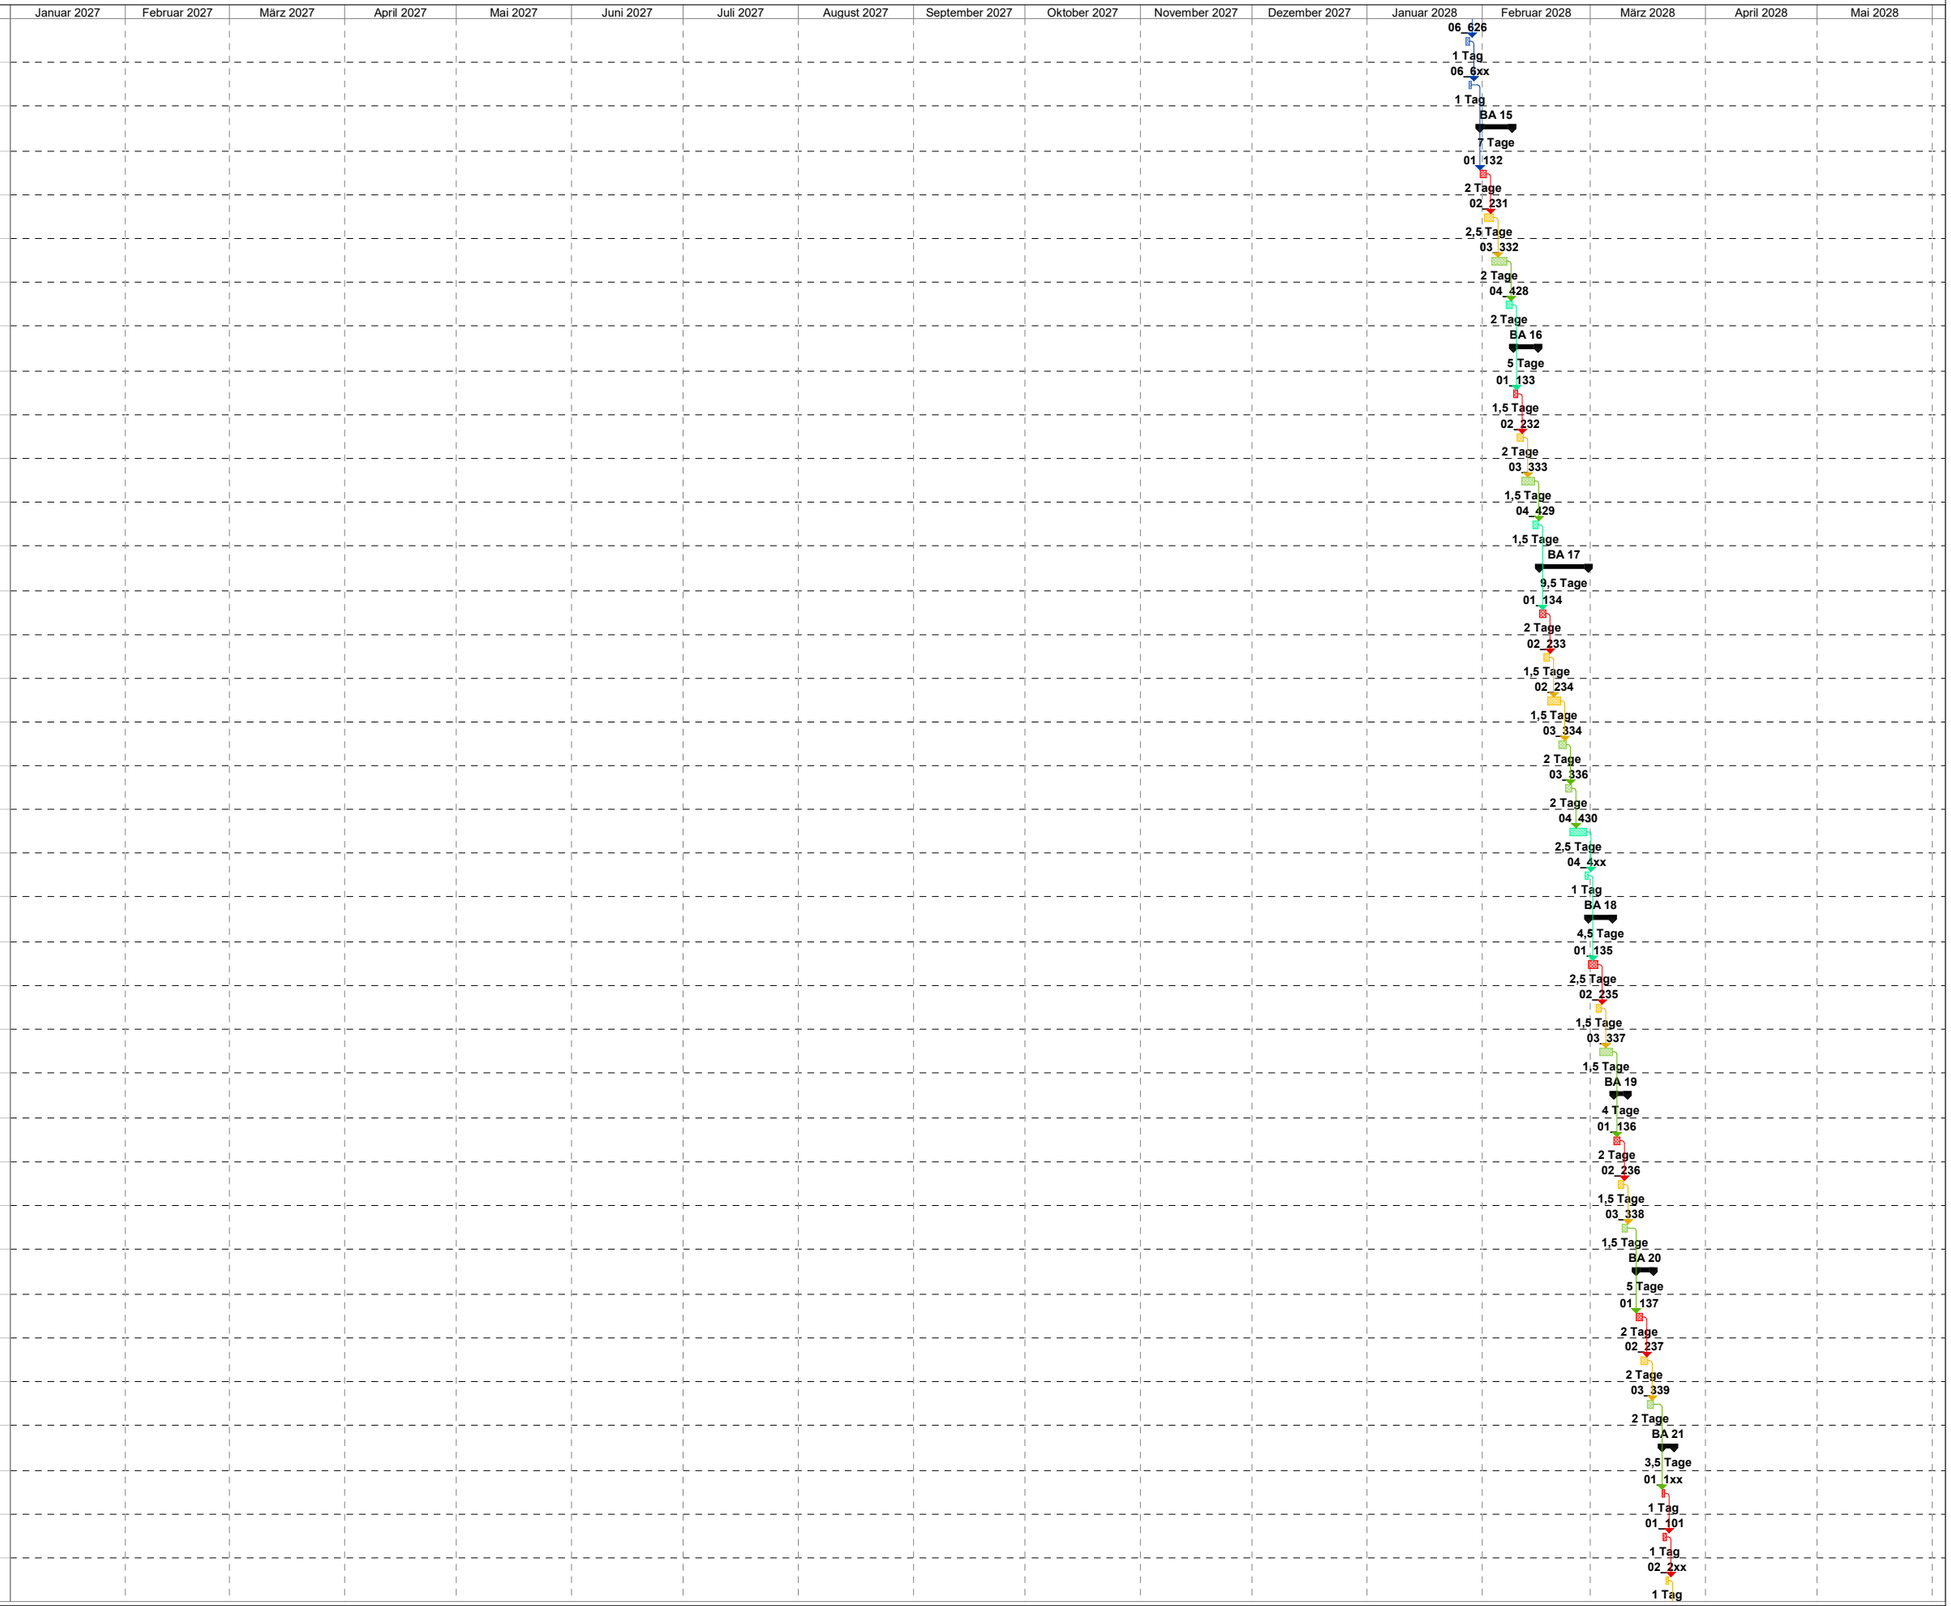

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
180	02_201	1 Tag	179EA-0,5 Tage
181	03_3xx	1 Tag	180EA-0,5 Tage
182	03_301	1 Tag	181EA-0,5 Tage
183	**EG**	**40 Tage**	
184	00_001	2 Tage	182
185	00_015	3 Tage	184
186	00_TRH 3	1 Tag	185
187	00_TRH 6	4 Tage	186
188	00_TRH 7	4 Tage	187
189	00_Wachtmeisterei (Abschnitte ?)	12 Tage	188
190	00_024	4 Tage	189
191	00_Luftraum Foyer	10 Tage	190
192	**Ansicht 17 bis 19**	**30 Tage**	
217	**Ansicht 25 bis 19**	**193 Tage**	
218	Aufbau Gerüst	13 Tage	219AE
219	Standzeit Gerüst	146 Tage	254AA
220	Abbau Gerüst	14 Tage	348;219
221	**BA 25**	**5 Tage**	
222	01_156	1 Tag	216
223	01_155	1,5 Tage	222EA-0,5 Tage
224	02_255	1 Tag	223EA-0,5 Tage
225	02_256	1,5 Tage	224EA-0,5 Tage
226	03_355	1 Tag	225EA-0,5 Tage
227	03_356	1,5 Tage	226EA-0,5 Tage
228	**BA 26**	**13,5 Tage**	
229	01_154	1,5 Tage	227
230	01_153	1,5 Tage	229EA-0,5 Tage
231	02_254	1,5 Tage	230EA-0,5 Tage
232	02_253	1,5 Tage	231EA+0,5 Tage
233	03_354	1,5 Tage	232EA-0,5 Tage
234	03_353	1,5 Tage	233EA-0,5 Tage
235	04_454	1,5 Tage	234EA-0,5 Tage
236	04_453	1,5 Tage	235EA-0,5 Tage
237	05_554	1,5 Tage	236EA-0,5 Tage
238	05_553	1,5 Tage	237EA-0,5 Tage
239	06_6xx	1,5 Tage	238EA-0,5 Tage

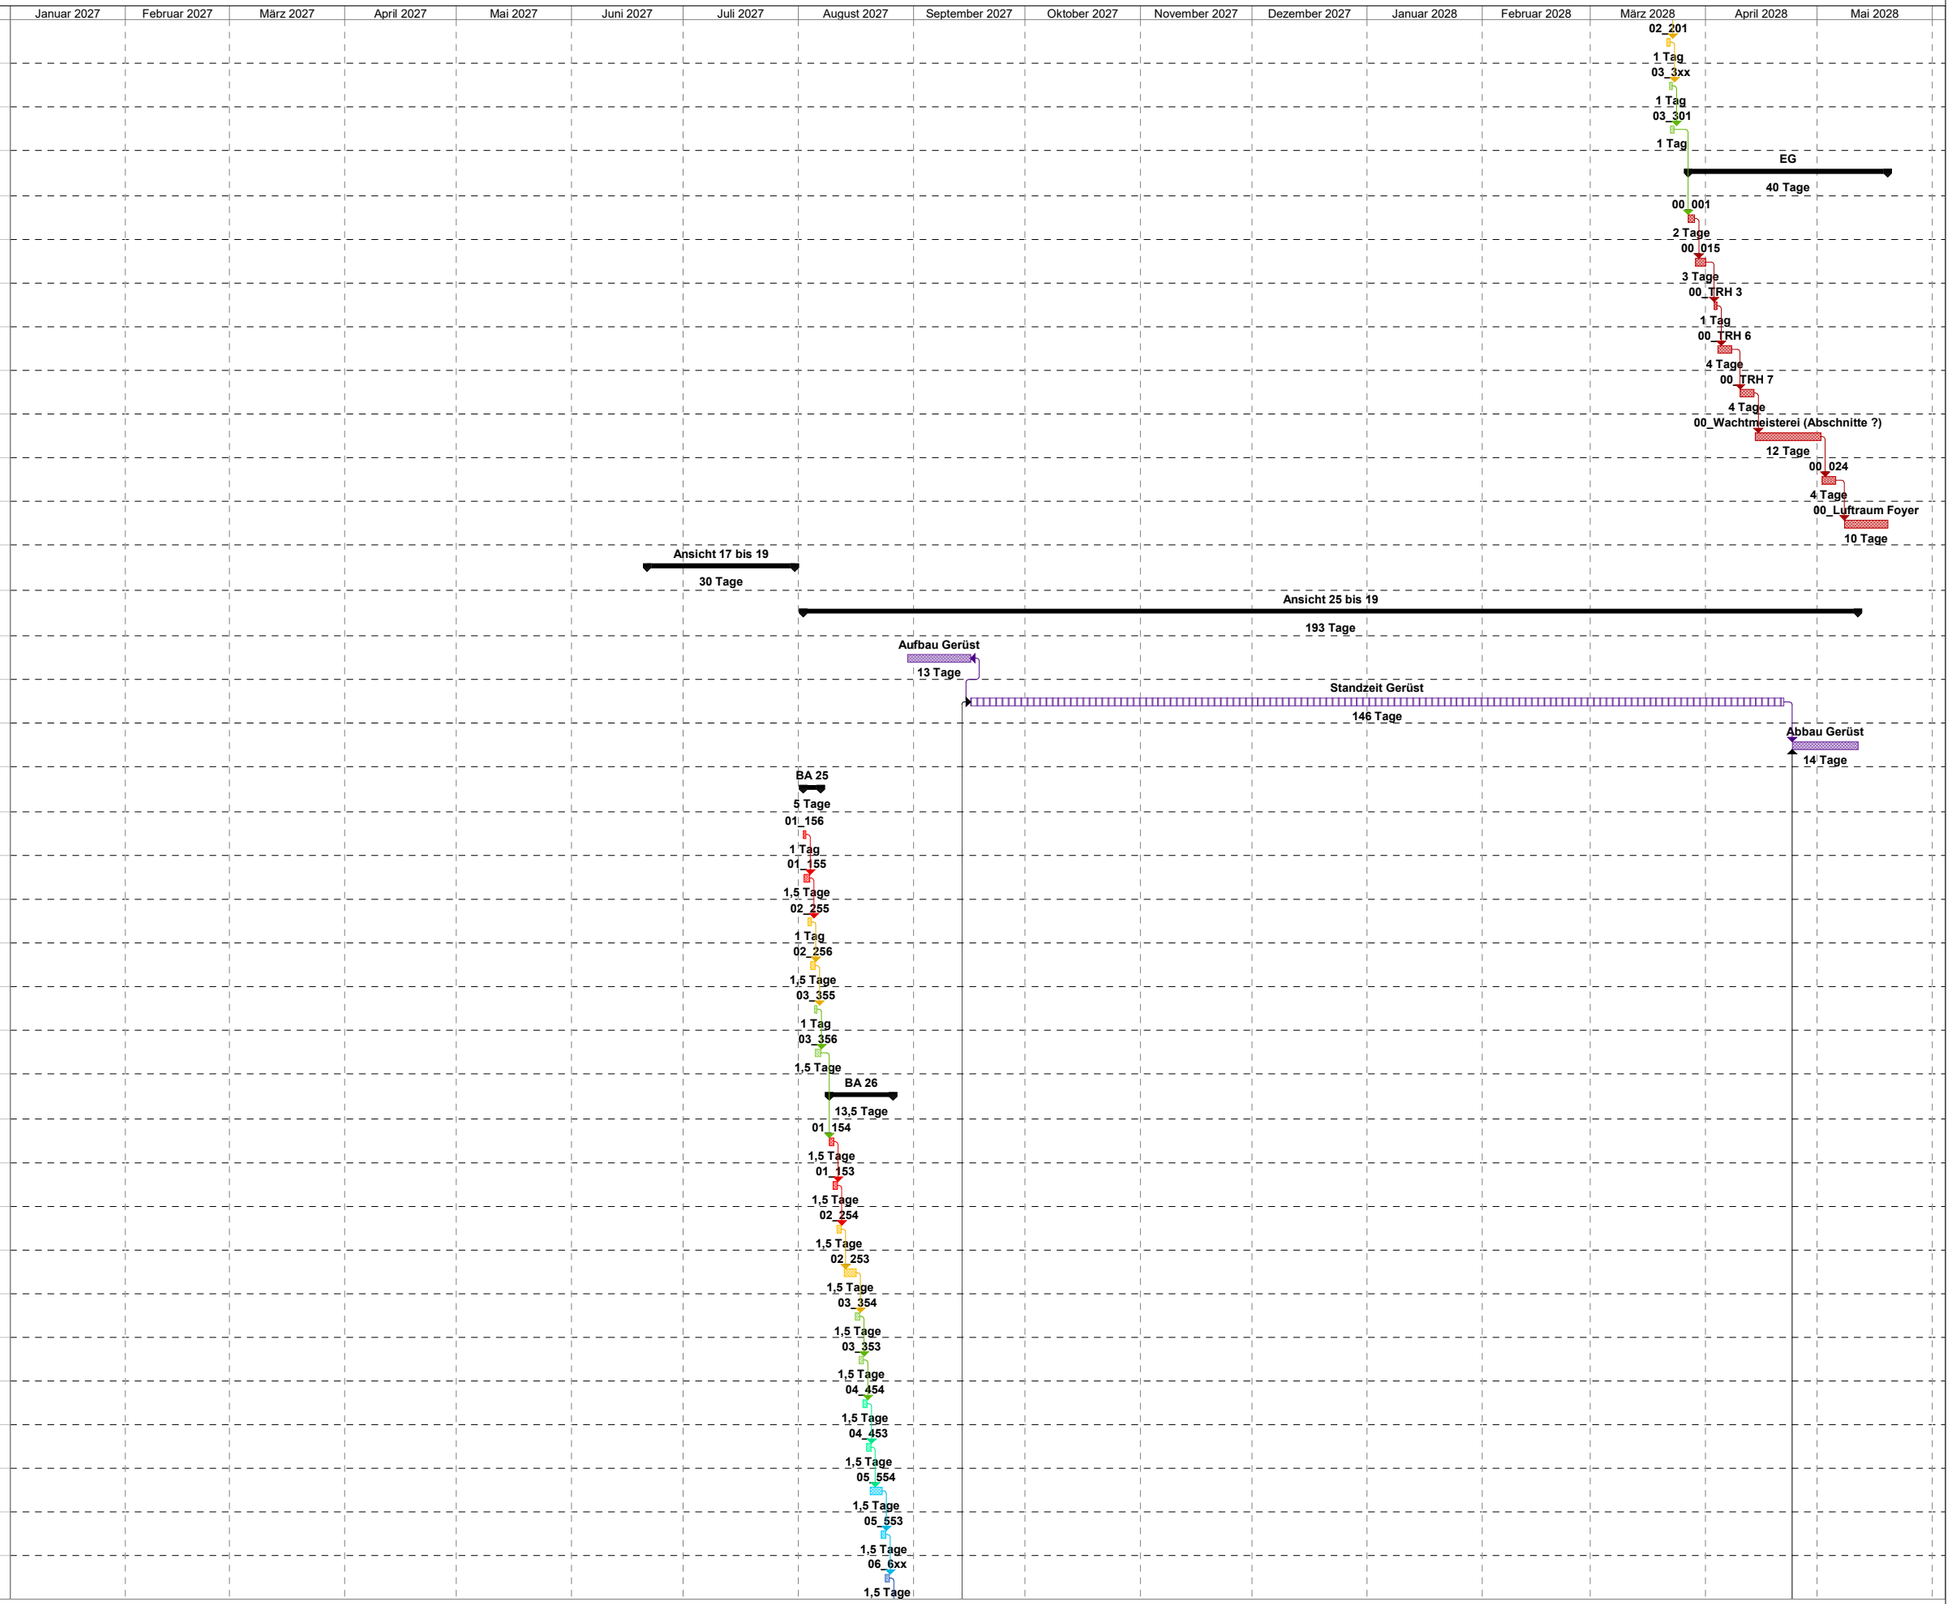

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
240	07_xxx	1,5 Tage	239EA-0,5 Tage
241	**BA 27**	**13,5 Tage**	
242	01_152	1,5 Tage	240
243	01_151	1,5 Tage	242EA-0,5 Tage
244	02_252	1,5 Tage	243EA-0,5 Tage
245	02_251	1,5 Tage	244EA+0,5 Tage
246	03_352	1,5 Tage	245EA-0,5 Tage
247	03_351	1,5 Tage	246EA-0,5 Tage
248	04_452	1,5 Tage	247EA-0,5 Tage
249	04_451	1,5 Tage	248EA-0,5 Tage
250	05_552	1,5 Tage	249EA-0,5 Tage
251	05_551	1,5 Tage	250EA-0,5 Tage
252	06_651	1,5 Tage	251EA-0,5 Tage
253	07_xxx	1,5 Tage	252EA-0,5 Tage
254	**BA 28**	**27 Tage**	
255	01_122	1,5 Tage	253
256	01_121	1,5 Tage	255EA-0,5 Tage
257	01_120	1,5 Tage	256EA-0,5 Tage
258	02_219	1,5 Tage	257EA-0,5 Tage
259	02_218	1,5 Tage	258EA-0,5 Tage
260	02_217	2 Tage	259EA-0,5 Tage
261	03_320	1,5 Tage	260EA-0,5 Tage
262	03_319	1,5 Tage	261EA-0,5 Tage
263	03_318	1,5 Tage	262EA-0,5 Tage
264	04_418	1,5 Tage	263EA-0,5 Tage
265	04_417	1,5 Tage	264EA-0,5 Tage
266	04_416	1,5 Tage	265EA-0,5 Tage
267	05_513	1,5 Tage	266EA-0,5 Tage
268	05_512	1,5 Tage	267EA-0,5 Tage
269	05_511	1,5 Tage	268EA-0,5 Tage
270	06_612	1,5 Tage	269EA-0,5 Tage
271	06_611	1,5 Tage	270EA-0,5 Tage
272	06_610	2 Tage	271EA-0,5 Tage
273	07_Speiseraum Teil 1	8 Tage	272EA-0,5 Tage
274	**BA 29**	**14,5 Tage**	
275	01_118/119	2,5 Tage	273

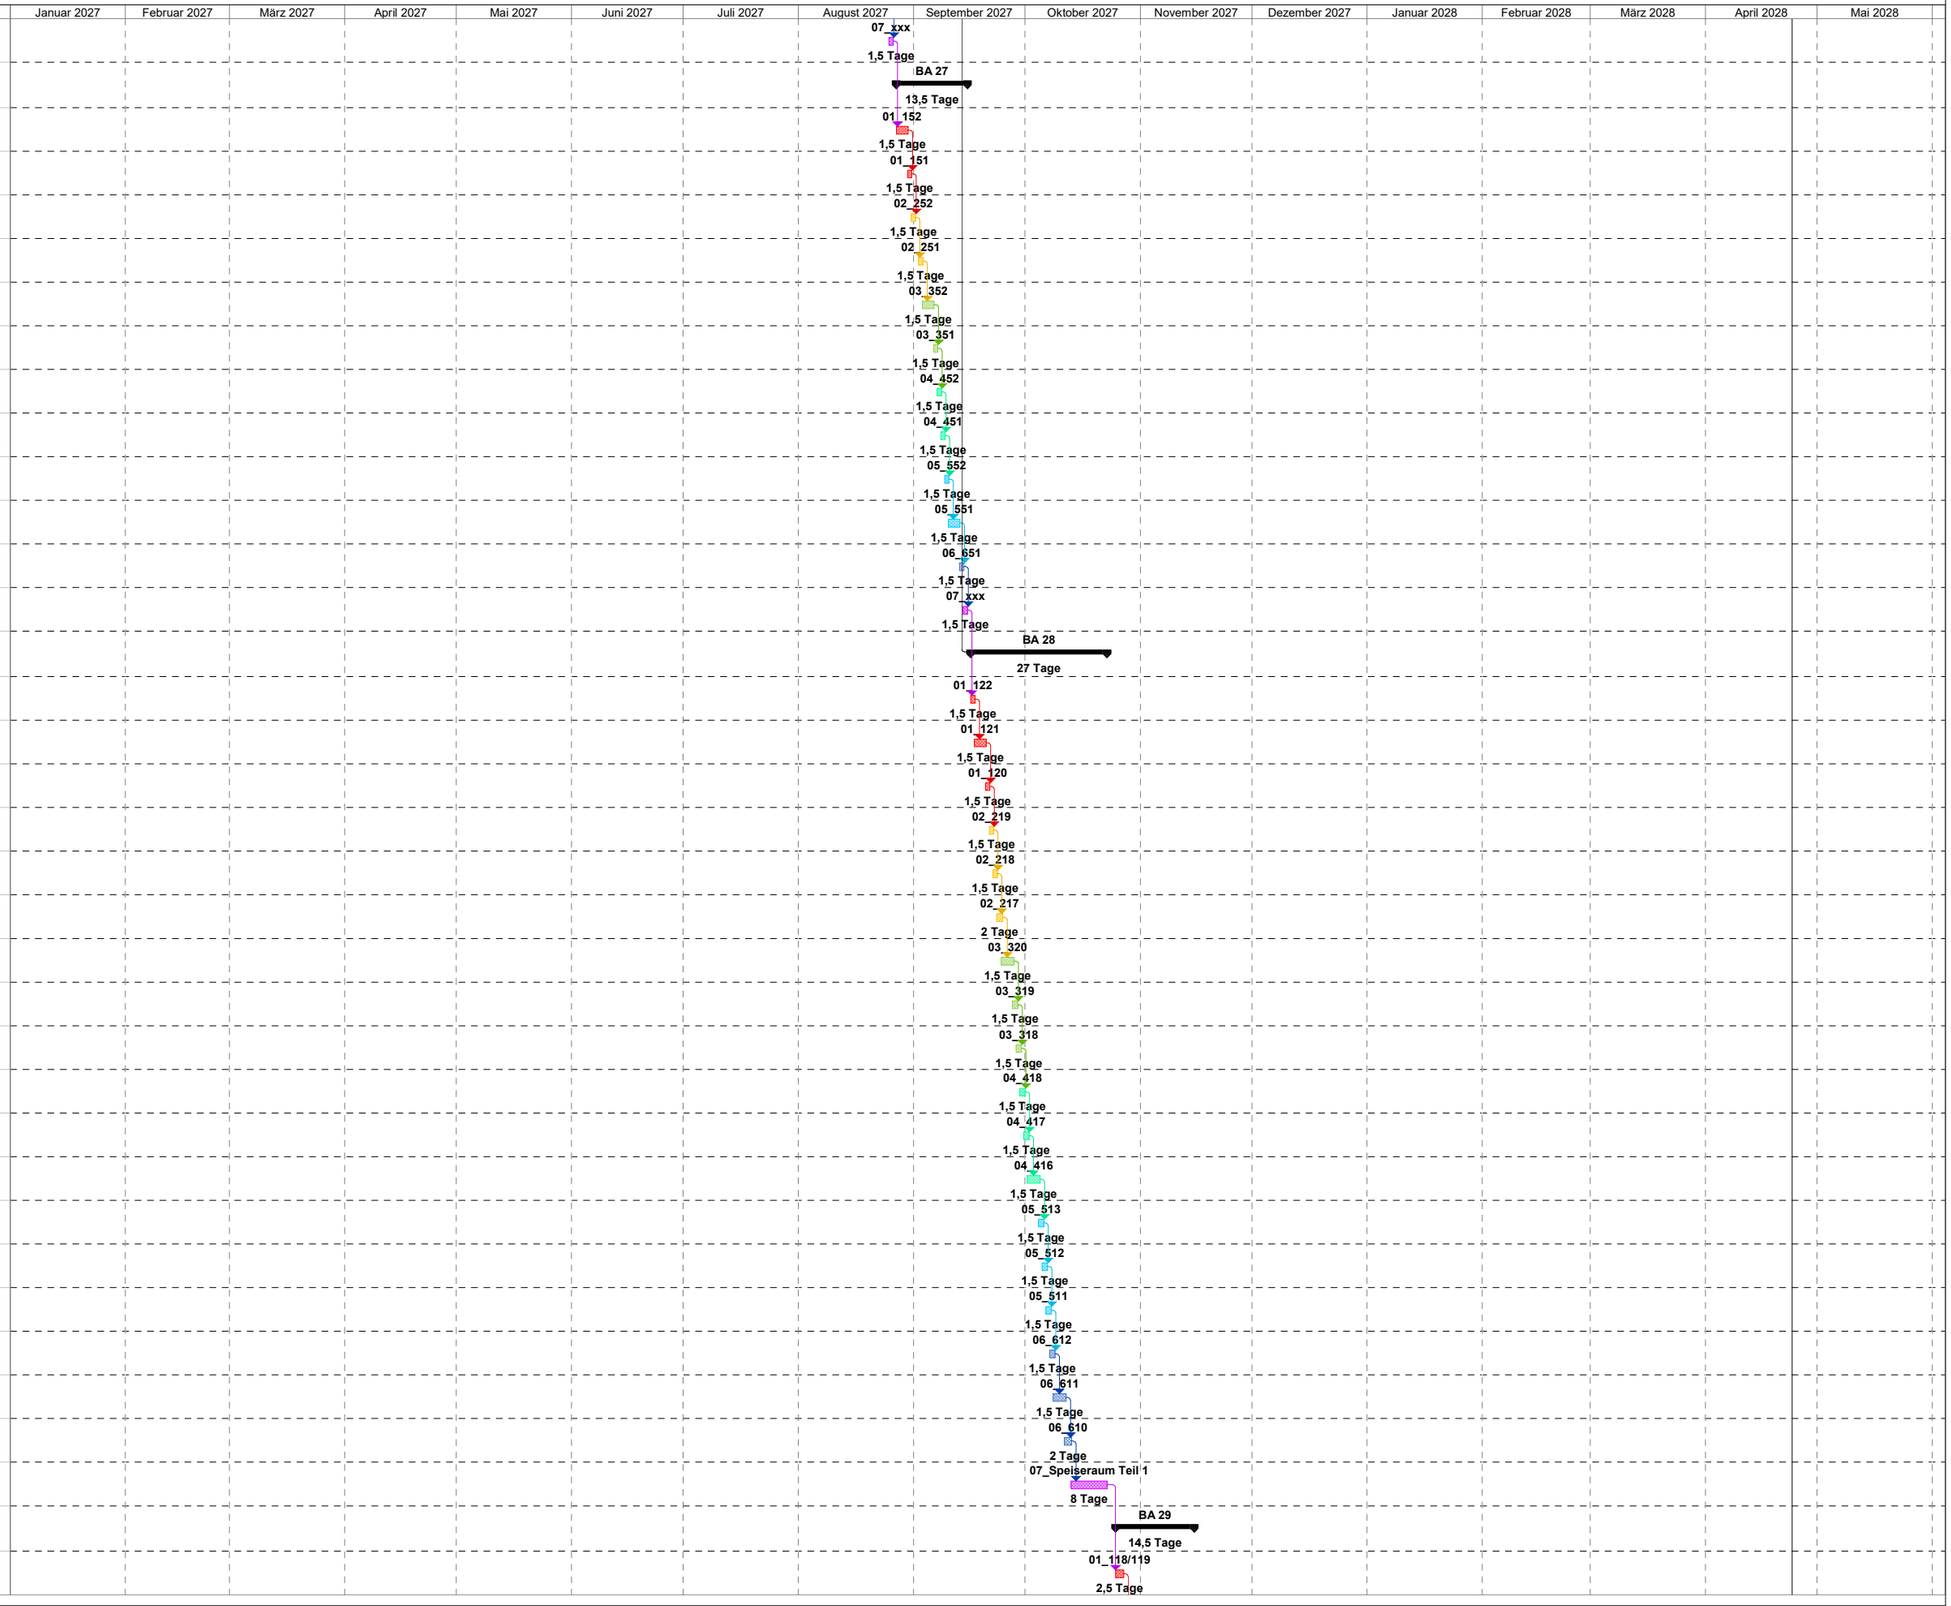

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
276	02_216	2 Tage	275EA-0,5 Tage
277	02_215	1,5 Tage	276EA-0,5 Tage
278	03_317	2 Tage	277EA-0,5 Tage
279	03_316	1,5 Tage	278EA-0,5 Tage
280	04_415	2 Tage	279EA-0,5 Tage
281	04_414	1,5 Tage	280EA-0,5 Tage
282	05_510	2 Tage	281EA-0,5 Tage
283	05_509	1,5 Tage	282EA-0,5 Tage
284	06_609	2,5 Tage	283EA-0,5 Tage
285	**BA 30**	**24,5 Tage**	
286	01_117	1,5 Tage	284
287	02_214	2 Tage	286EA-0,5 Tage
288	02_213	1,5 Tage	287EA-0,5 Tage
289	02_212	1 Tag	287EA-0,5 Tage
290	03_315	1,5 Tage	289EA-0,5 Tage
291	03_314	1,5 Tage	290EA-0,5 Tage
292	03_313	2 Tage	290EA-0,5 Tage
293	04_413	1,5 Tage	292EA-0,5 Tage
294	04_412	2 Tage	293EA-0,5 Tage
295	05_508	1,5 Tage	294EA-0,5 Tage
296	05_507	1,5 Tage	295EA-0,5 Tage
297	05_506	1,5 Tage	296EA-0,5 Tage
298	06_608	2 Tage	297EA-0,5 Tage
299	06_607	1,5 Tage	298EA-0,5 Tage
300	Puffer	11 Tage	299EA-0,5 Tage
301	**BA 31**	**27 Tage**	
302	02_212a	2 Tage	300
303	02_211	1,5 Tage	302EA+0,5 Tage
304	03_312	2 Tage	303EA-0,5 Tage
305	03_311	1,5 Tage	304EA-0,5 Tage
306	04_410	2,5 Tage	305EA-0,5 Tage
307	04_409	1,5 Tage	306EA-0,5 Tage
308	05_505	2,5 Tage	307EA-0,5 Tage
309	05_504	1,5 Tage	308EA-0,5 Tage
310	06_606	2,5 Tage	309EA-0,5 Tage
311	06_605	1,5 Tage	310EA-0,5 Tage

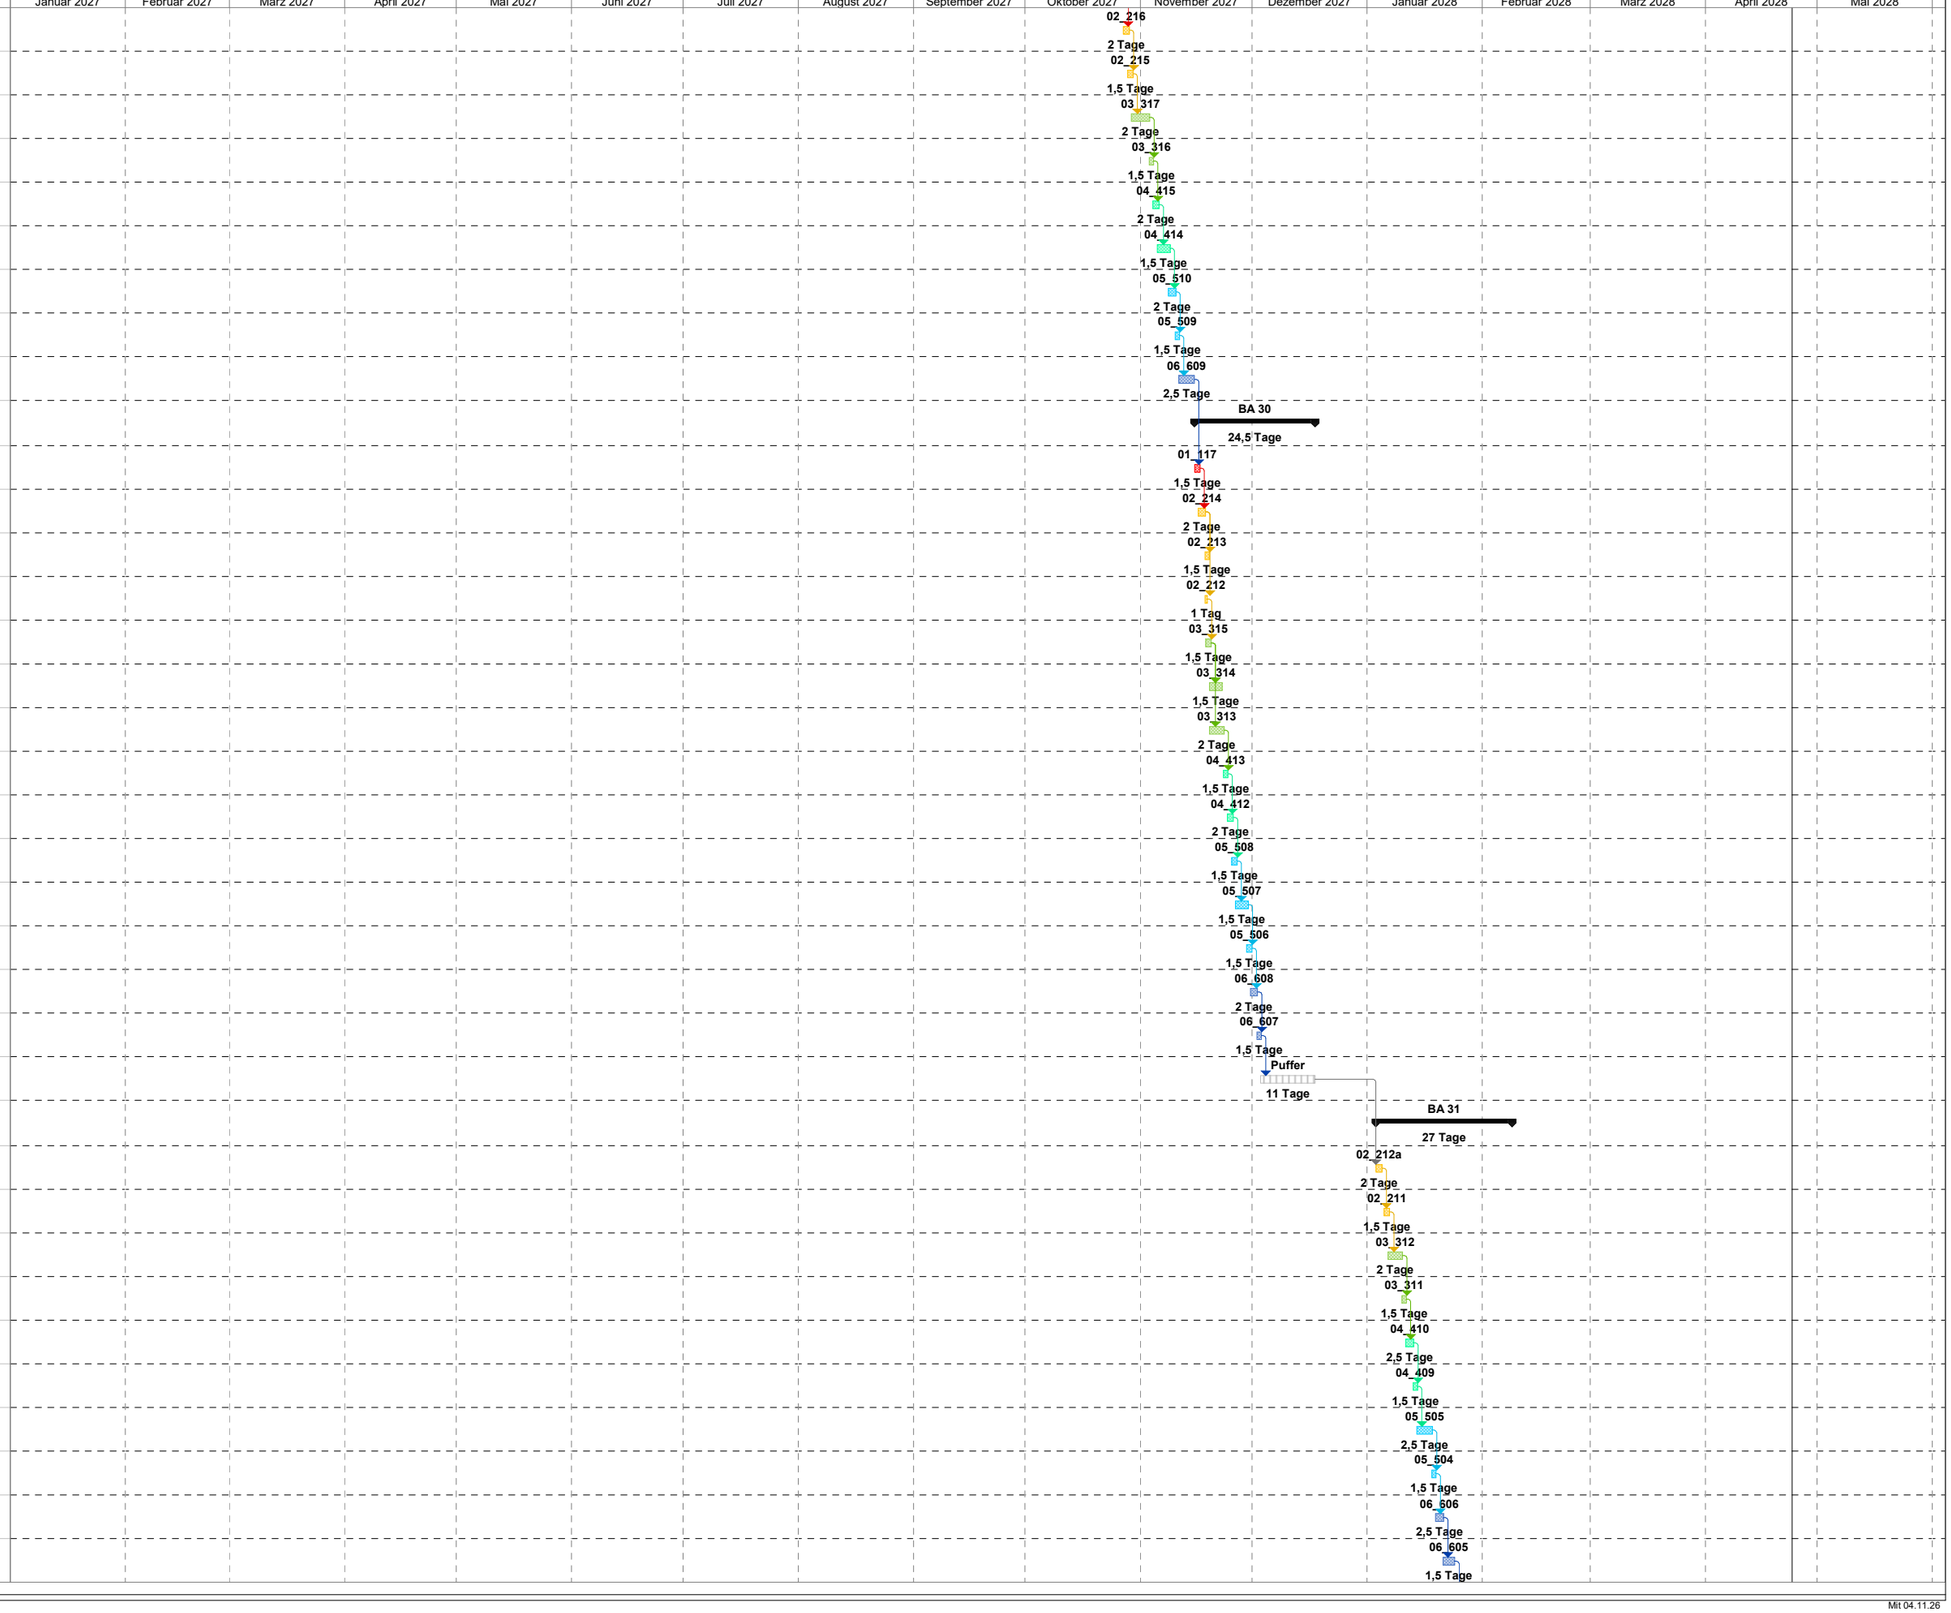

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
312	07_Speiseraum Teil 2	12 Tage	311EA-0,5 Tage
313	**BA 32**	**11,5 Tage**	
314	02_210	1,5 Tage	312
315	02_209	1,5 Tage	314EA+0,5 Tage
316	03_310	1,5 Tage	315EA-0,5 Tage
317	03_309	1,5 Tage	316EA-0,5 Tage
318	04_408	1,5 Tage	317EA-0,5 Tage
319	04_407	2 Tage	318EA-0,5 Tage
320	05_503	2 Tage	319EA-0,5 Tage
321	06_605	1,5 Tage	320EA-0,5 Tage
322	06_604	1,5 Tage	321EA-0,5 Tage
323	**BA 33**	**13 Tage**	
324	02_208	1,5 Tage	322
325	02_207	1,5 Tage	324EA+0,5 Tage
326	03_308	1,5 Tage	325EA-0,5 Tage
327	03_307	1,5 Tage	326EA-0,5 Tage
328	04_406	1,5 Tage	327EA-0,5 Tage
329	04_405	1,5 Tage	328EA-0,5 Tage
330	05_502	2 Tage	329EA-0,5 Tage
331	05_501	2 Tage	330EA-0,5 Tage
332	06_602	1,5 Tage	331EA-0,5 Tage
333	06_601	2 Tage	332EA-0,5 Tage
334	**BA 34**	**7,5 Tage**	
335	02_206	1,5 Tage	333
336	02_205	1,5 Tage	335EA+0,5 Tage
337	03_306	1,5 Tage	336EA-0,5 Tage
338	03_305	1,5 Tage	337EA-0,5 Tage
339	04_404	1,5 Tage	338EA-0,5 Tage
340	04_403	1,5 Tage	339EA-0,5 Tage
341	**BA 35**	**7 Tage**	
342	01_103	1 Tag	340
343	02_204	1,5 Tage	342EA-0,5 Tage
344	02_203	1,5 Tage	343EA+0,5 Tage
345	03_304	1,5 Tage	344EA-0,5 Tage
346	03_303	1,5 Tage	345EA-0,5 Tage
347	04_402	1,5 Tage	346EA-0,5 Tage

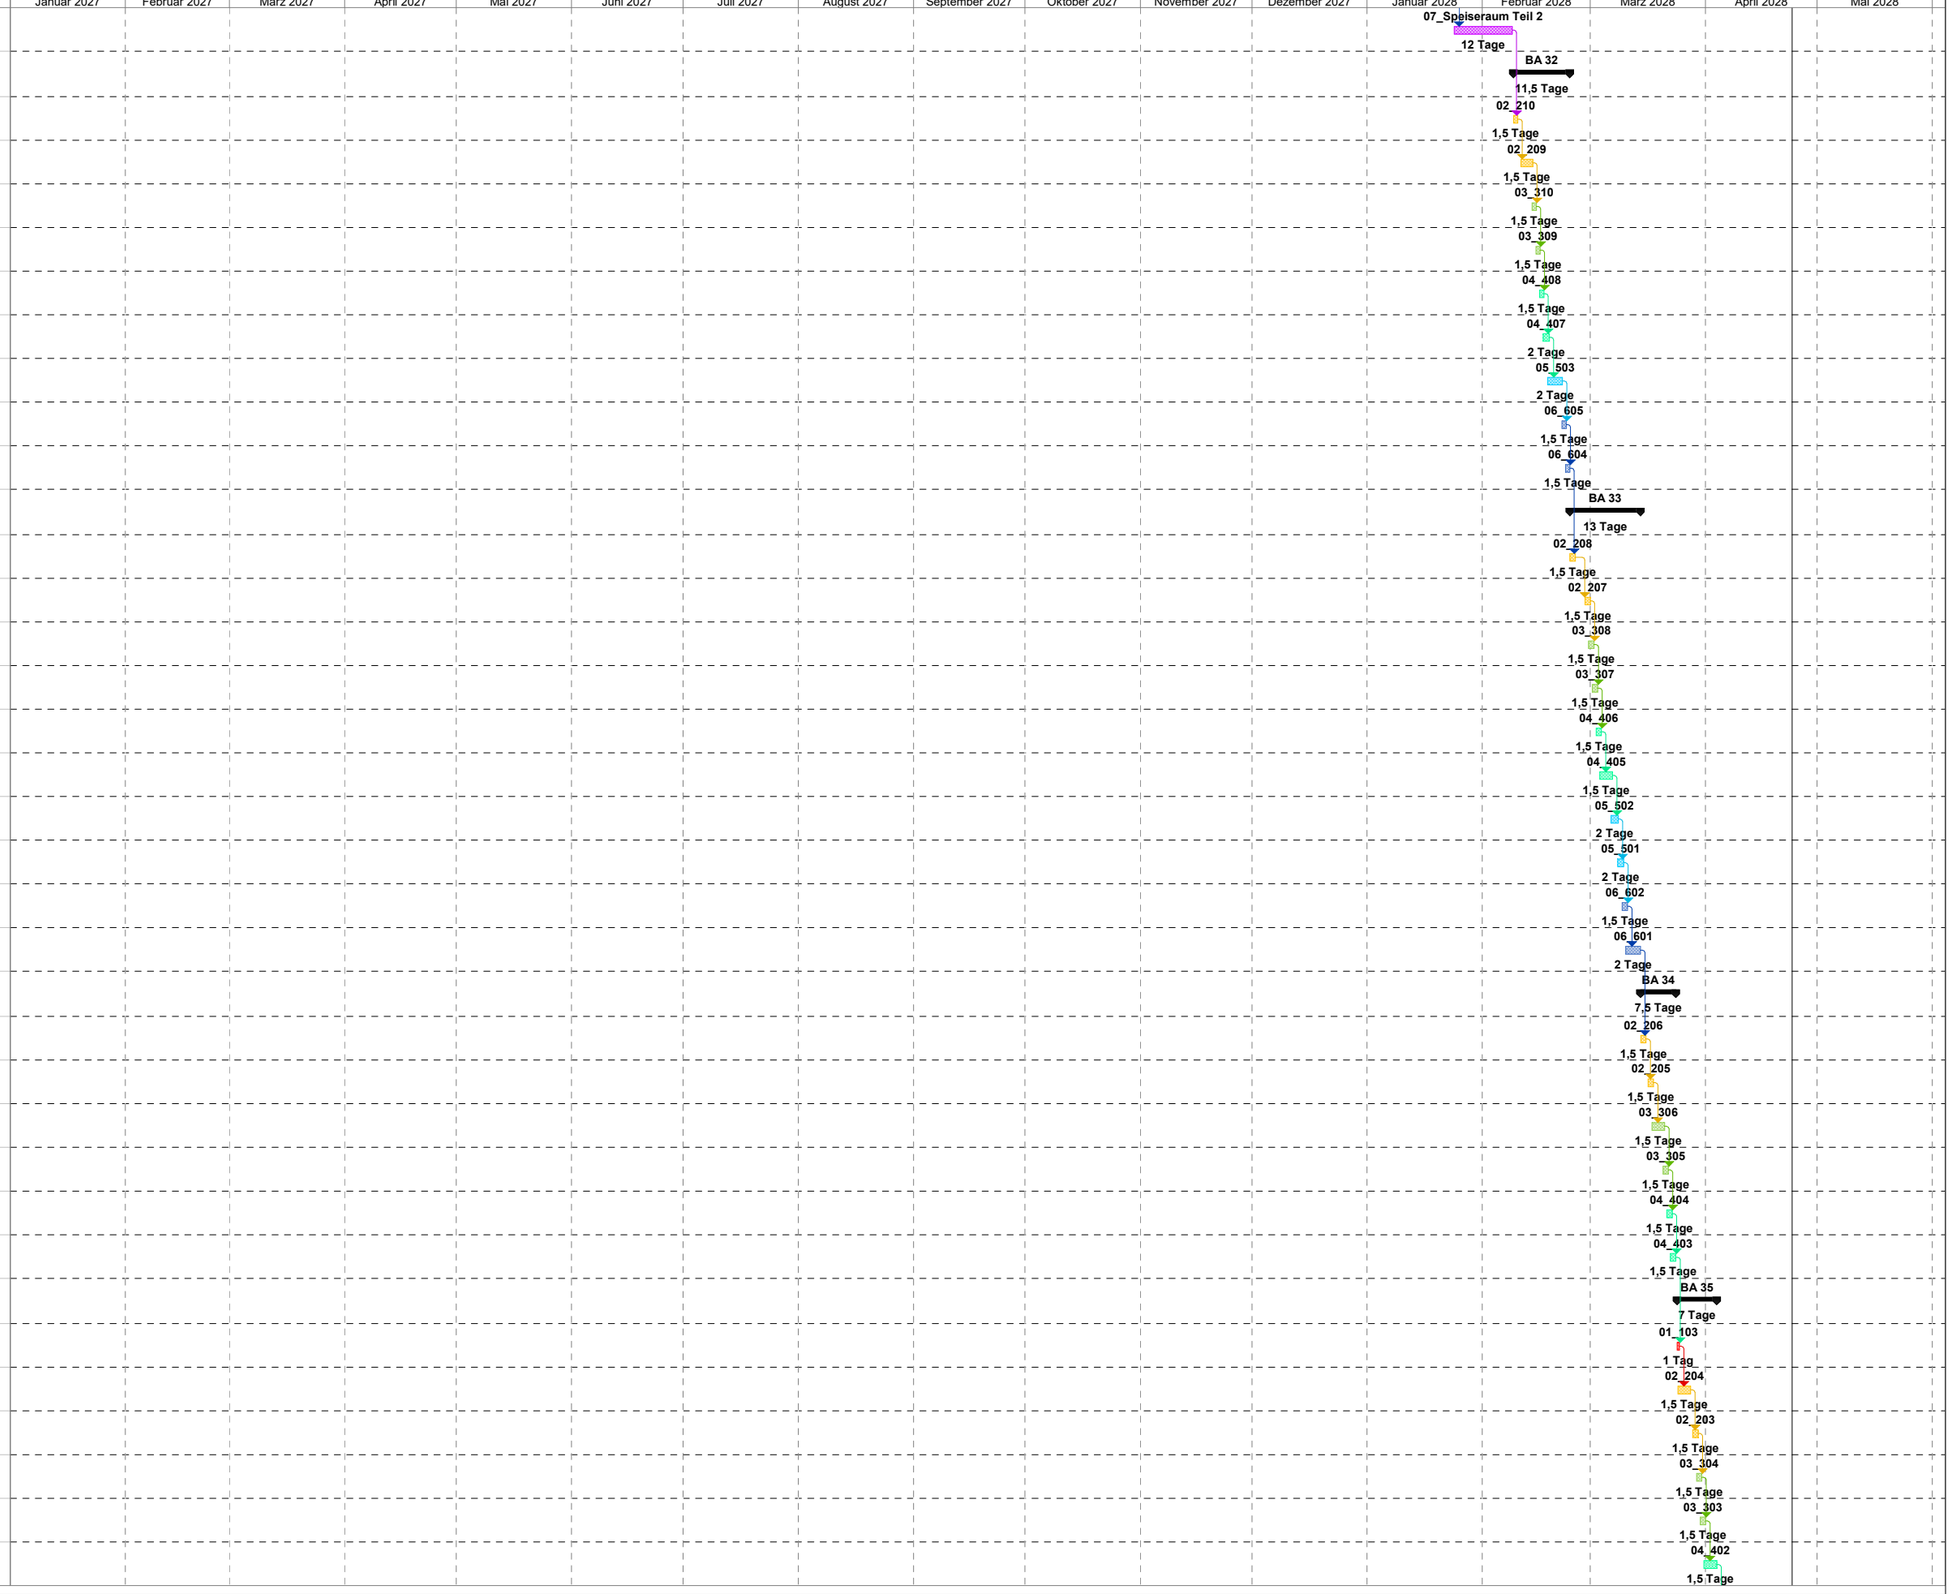


Mit 04.11.26

Justizzentrum MS - Terminplan

Die jeweiligen Vorgangsdauern sind voraussichtliche Ausführungszeiten.

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger
348	**BA 36**	**13,5 Tage**	
349	01_102	1,5 Tage	347
350	01_01	3 Tage	349EA-0,5 Tage
351	02_202	1,5 Tage	350EA-0,5 Tage
352	02_201	3 Tage	351EA+0,5 Tage
353	03_302	1,5 Tage	352EA-0,5 Tage
354	03_301	3 Tage	353EA-0,5 Tage
355	04_401	2 Tage	354EA-0,5 Tage

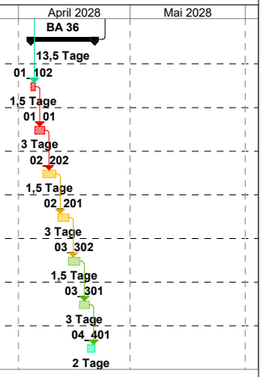

Mit 04.11.26
